크로바가구 홈페이지 · 결과 보고

4월 15일 착수한 새 홈페이지, 24주 만에 cloveroa.co.kr로 정식 오픈했습니다

4월 30일 베타 사이트를 공개해 크로바가구가 화면을 직접 보며 수정 의견을 주는 방식으로 22주 동안 다듬었습니다. 같은 기간에 지능형 카탈로그에 들어갈 이미지 97장과 영상 6개 시리즈도 함께 제작했습니다. 9월 말에는 사이트를 크로바가구 소유 서버로 옮기고, 속도·보안·검색 등록을 정비한 뒤 기존 도메인으로 전환했습니다. 이 보고서는 제작 기록(변경 이력·작업 이슈·운영 문서)을 근거로 무엇을 만들었고, 오픈 과정에서 무엇이 나아졌고, 무엇이 남았는지를 정리합니다.


작성 2026-10-16 · 베이스 대상 cloveroa.co.kr 공개 페이지 14개 + 관리자 화면 출처는 마지막 페이지에

24 주 착수부터 정식 오픈까지 착수 4/15 · 베타 공개 4/30 정식 오픈 9/30	**83** 건 반영한 변경 베타 기간 54건 오픈 준비·안정화 29건	**14** 개 공개 페이지 14개 모두 검색엔진에 제출 구글·네이버 소유 확인 완료
97 장 카탈로그 이미지 지능형 카탈로그 탑재용 AI 생성·보정	**6** 개 시리즈 영상 제작 베타 운영 기간 중 제작	**−73** % 첫 화면 용량 4.6MB → 1.2MB 글꼴만 3.7MB → 422KB

일정

베타 공개 후 22주 동안 고객 의견을 반영하고, 마지막 2주에 운영 전환

착수 2주 만에 베타 사이트를 공개했습니다. 이후에는 크로바가구가 실제 화면을 보며 의견을 주면 바로 반영하는 방식으로 진행했고, 7월에 두 차례 큰 개편(2차·3차 리뉴얼)을 거쳤습니다. 사이트 수정과 함께 지능형 카탈로그 이미지 97장과 영상 6개 시리즈를 제작했습니다. 9월 22일부터 운영 전환 작업을 시작해 9월 30일 정식 오픈했고, 10월 13일까지 안정화와 추가 요청을 처리했습니다.

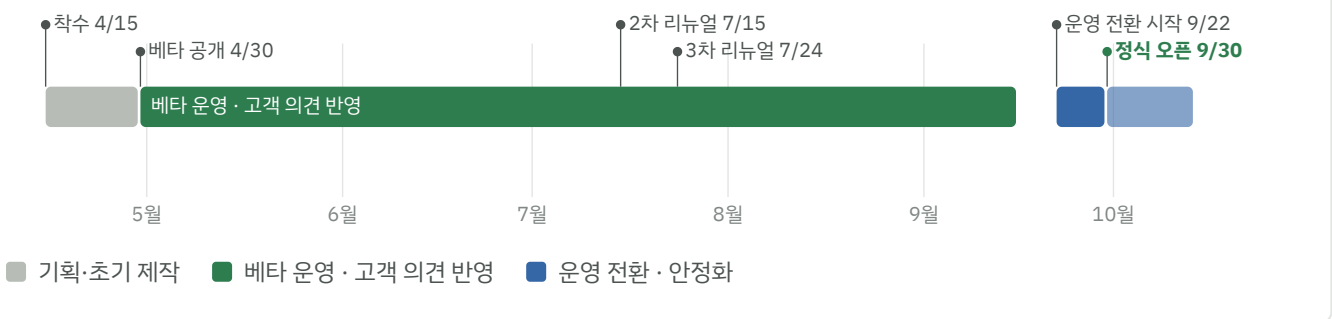


변경 기록

변경 83건 중 35%가 마지막 3주에 몰렸습니다

베타 기간에는 7월 2차·3차 리뉴얼 주간에 변경이 가장 많았습니다. 7월 말부터 8월 말까지는 사이트 변경 없이 콘텐츠를 준비했습니다. 운영 전환을 시작한 9월 넷째 주부터 2주 동안 28건을 반영했습니다.

주별 반영 건수

주 시작일(월요일) 기준. 같은 변경을 운영에 합치는 병합 기록은 세지 않았습니다.

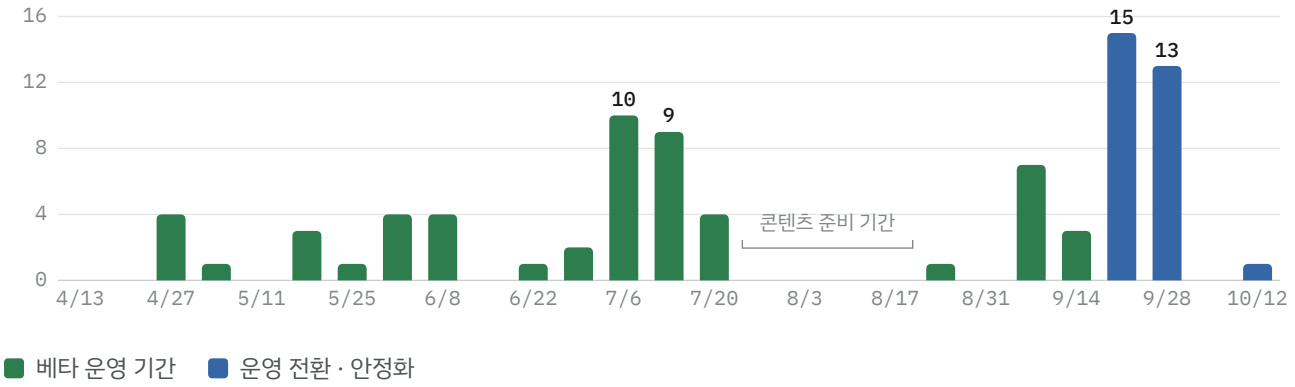


무엇을 했나


베타 기간에는 화면과 관리 기능을, 오픈 준비 기간에는 안정성과 검색 노출을 다뤘습니다

변경 하나하나를 내용별로 나눴습니다. 베타 기간 54건 중 32건이 화면 디자인과 관리자 기능입니다. 오픈 준비 기간 29건 중 14건은 보안·서버, 속도, 검색 등록입니다. 방문자 눈에 직접 보이지는 않지만 운영에 꼭 필요한 일입니다.

베타 운영 기간 (4/15 ~ 9/15, 54건)

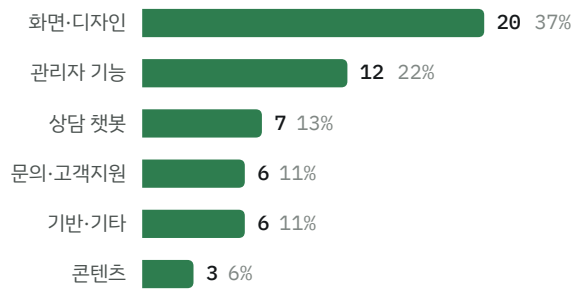

운영 전환 · 안정화 (9/22 ~ 10/13, 29건)

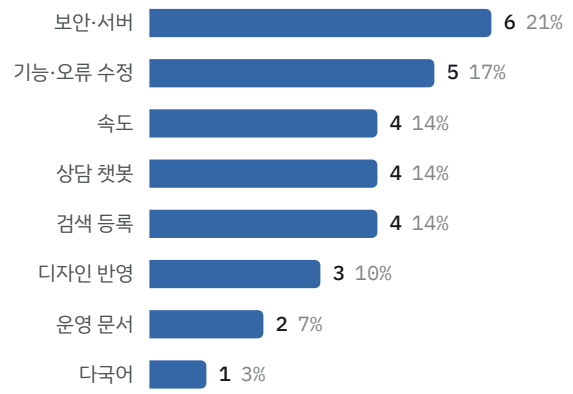

만든 것

공개 페이지 14개, 관리자 화면, 카탈로그 이미지 97장과 영상 6개 시리즈

제품군은 공간별로 나눠 7개 페이지로 구성했습니다. 회사소개·자료실·고객지원 등 대부분의 내용은 관리자 화면에서 개발자 없이 수정할 수 있습니다. 사이트와 별도로, 지능형 카탈로그에 들어갈 이미지와 영상도 제작했습니다.

회사 · 브랜드

홈	/
회사소개	/about
마감재	/materials
AI 허브 (지능형 카탈로그 바로가기)	/ai-hub
자료실 (카탈로그 내려받기)	/archive
고객지원 (B2B 문의 접수)	/support

제품 · 공간

공간 솔루션 (전체)	/spaces
우수제품	/spaces/excellent
사무용 시스템	/spaces/office
파티션	/spaces/partition
교육용	/spaces/education
중역용	/spaces/executive
의자	/spaces/chair
소파·라운지	/spaces/sofa

관리자 화면에서 할 수 있는 일

회사소개·자료실·고객지원 페이지 내용 편집	편집기
공간·마감재 이미지와 설명 교체	편집기
로고·글꼴(20종 중 선택) 변경	설정
B2B 문의 확인·일괄 삭제	접수함
문의 알림 메일 설정과 발송 기록	메일
상담 챗봇 답변(FAQ)과 참고 페이지 등록	챗봇
이미지·영상 업로드(자동 압축)	업로드

콘텐츠 제작 (베타 운영 기간 중)

지능형 카탈로그 탑재용 제품 이미지	97장
이미지 작업 방식	AI 생성·보정
영상	6개 시리즈

이미지와 영상 제작은 사이트 소스 변경이 아니므로 위 변경 건수 83건에는 들어가지 않습니다.

오픈 전후

정식 오픈하면서 무엇이 달라졌나

베타 사이트는 화면을 빠르게 보여 주기 위한 임시 환경에서 운영했습니다. 정식 오픈 전에 아래 항목을 정비했습니다. 화면 디자인은 바꾸지 않았습니다.

항목	베타 (임시 환경)	정식 오픈 후
주소	임시 주소	cloveroa.co.kr, www 포함 · HTTPS 적용(인증서 자동 갱신) · http 접속은 https로 자동 이동
서버 소유	임시 호스팅	크로바가구 소유 클라우드 서버(서울 리전)
첫 화면 용량	4.6MB	1.2MB **−73%**
글꼴	방문할 때마다 한글 글꼴 십여 종을 모두 받음 (3.7MB)	선택된 글꼴만 받음 (422KB) **−89%**
글꼴 선택	관리자 20종 중 일부는 골라도 적용되지 않음 · 1종은 외부 서버 오류로 실패	20종 모두 실제 적용
이미지·영상	해외 저장소에서 매번 직접 전송	서울 CDN에서 캐시 전송 · 기존 이미지 주소 일괄 전환
보안	챗봇용 외부 서비스 키가 브라우저로 전달됨 · 업로드에 관리자 확인 없음	키는 서버에만 보관 · 업로드는 관리자 확인 후, 허용한 파일 형식만
검색 노출	검색엔진이 내용 없는 빈 페이지를 읽음	14개 페이지를 내용이 채워진 상태로 제공 · 사이트맵·구글 서치콘솔·네이버 서치어드바이저 등록
언어	한국어	한국어·영어 전환
상담 챗봇	고정 답변 위주	관리자에 등록한 회사 정보·FAQ·참고 페이지를 읽고 답변 · 응답 엔진 교체(예비 엔진 유지)
회사 메일	—	도메인을 옮기면서 기존 회사 메일 설정은 그대로 유지
수정 반영 방식	바로 공개 사이트에 반영	미리보기 서버에서 먼저 확인한 뒤 공개 사이트에 반영

용량은 9/22 홈 첫 화면을 같은 조건에서 변경 전후로 측정한 값입니다.

앞으로의 수정 방법

수정 요청은 미리보기에서 먼저 확인하고 공개합니다

오픈 이후에는 공개 사이트를 직접 고치지 않습니다. 잘못 반영돼도 방문자에게 보이기 전에 걸러지고, 문제가 생기면 이전 버전으로 바로 되돌릴 수 있습니다.

1
요청
디자인·기능 변경 요청을 받습니다. 글·이미지 교체는 관리자 화면에서 직접 할 수 있습니다.

2
미리보기 반영
변경 내용을 미리보기 서버에 먼저 올립니다.

3
크로바가구 확인
미리보기 화면을 보고 확인해 주시면 다음 단계로 넘어갑니다.

4
공개 반영
공개 사이트에 반영하고 정상 동작을 점검합니다. 문제가 있으면 이전 버전으로 되돌립니다.

> 이미지와 파일은 관리자 화면(/admin)에서 올려 주세요. 다른 경로로 올린 이미지는 공개 사이트에서 깨져 보일 수 있습니다.

남은 작업

남은 작업 3가지와, 크로바가구에서 준비해 주실 것

사이트는 정상 운영 중입니다. 아래는 장기 운영을 위해 이어서 할 작업입니다. 가장 큰 일은 데이터 저장소 이전이며, 코드 준비는 끝났고 운영 데이터베이스가 마련되면 바로 진행합니다.

데이터
데이터 저장소를 회사 소유로 이전
페이지 내용·문의 내역·메일 설정이 아직 베타 때 쓰던 임시 저장소에 있습니다. 이를 크로바가구 소유 데이터베이스(PostgreSQL)로 옮깁니다. 이전 코드와 데이터 이관 스크립트는 준비되어 있습니다.

준비해 주실 것: 운영 데이터베이스 생성, 접속 정보와 문의 메일 발송 계정 비밀번호 등록

보안
관리자 정식 로그인
지금은 관리자 화면에 화면 비밀번호 하나로 들어갑니다. 데이터 이전과 함께 관리자별 계정으로 로그인하고, 허용한 사람만 들어올 수 있게 바꿉니다.

준비해 주실 것: 관리자로 등록할 사람의 이메일 목록

보안
HTTPS 강제 설정
브라우저가 항상 보안 연결(https)로만 접속하도록 서버 설정을 하나 더합니다. 지금도 http 접속은 https로 옮겨지지만, 이 설정을 더하면 첫 접속부터 보안 연결이 보장됩니다.

준비해 주실 것: 없음 · 베이스에서 진행

부록

숫자 근거

위 숫자를 다시 계산할 수 있도록 기간과 집계 기준을 남깁니다.

1. 기간

착수	2026-04-15
베타 공개	2026-04-30 · 고객 확인과 의견 교환 시작
베타 마지막 변경	2026-09-15
운영 전환 시작	2026-09-22
정식 오픈	2026-09-30 · 도메인 전환·HTTPS 완료
최근 반영	2026-10-13 · AI 허브 PDF 뷰어 바로가기
계산	4/15 → 9/30 = 168일 = 24주 4/30 → 9/30 = 153일 ≈ 22주

2. 변경 건수 집계

구분	전체 기록	병합 기록	반영한 변경
베타 운영 (4/15 ~ 9/15)	54	0	54
운영 전환 · 안정화 (9/22 ~ 10/13)	52	23	29
합계	**106**	**23**	**83**

병합 기록은 검토를 마친 변경을 공개 버전에 합친 기록이라 내용이 중복되므로 뺐습니다. 운영 전환 기간에는 변경을 22개 묶음으로 검토해 반영했습니다 (1건은 요청에 따라 되돌림).

3. 내용별 분류 기준

화면·디자인	메뉴, 레이아웃, 색, 로고, 글꼴 체계, 리뉴얼, 디자인 요청 반영
관리자 기능	편집기, 업로드, 이미지 압축, 표·정렬 등 관리자 화면 기능
문의·고객지원	B2B 문의 접수, 접수함, 알림 메일, 고객지원 화면
상담 챗봇	챗봇 답변 규칙, 대화 처리, 지식 관리
보안·서버	키 보호, 업로드 인증, 서버 이전, 저장소 연결
속도	글꼴 경량화, 이미지·영상 CDN 전환, 기존 이미지 주소 정리
검색 등록	사이트맵·robots, 공통 메타 정보, 검색엔진 소유 확인, 페이지 미리 그리기
기반·기타	프로젝트 초기 설정, 패키지 정리, 운영 문서

출처와 방법

변경 기록: 홈페이지 소스 저장소의 전체 변경 이력 106건(2026-04-29 ~ 10-13). 4/15~4/28 기획·초기 제작은 저장소 생성 전이라 기록에 없습니다.

착수일·베타 공개일, 카탈로그 이미지 97장·영상 6개 시리즈: 베이스 프로젝트 담당 확인.

용량 측정: 9/22 홈 첫 화면 네트워크 측정(글꼴 경량화 작업 전후).

오픈 전후 비교·남은 작업: 베이스 작업 이슈와 운영 문서(2026-09-30 기준), 10/13 운영 점검 기록.
